

INFORME CONTABLE

CUENTA DE INVERSIÓN 2021

INFORME CONTABLE N.º 184/2022
Letra: TCP-AOP

CUENTA DE INVERSIÓN
CONTROL INCISOS 3.3.1 Y 4.2
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

Auditor Fiscal: Esteban S. TOVARES

Recibido
[Signature]
C.P. Leonardo VIVAS AHUMADA
Auditor Fiscal

Tribunal de Cuentas de la Provincia

10/06/2022 13:00hs

Ushuaia, 10/06/2022

TRIBUNAL DE CUENTAS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR





"2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

CUENTA DE INVERSIÓN – CONTROL INCISOS 3.3.1 Y 4.2

Entidad o Jurisdicción	Poder Ejecutivo
Período auditado	2021
Ley de Presupuesto	1333 y 1353

Índice

1. Informe Analítico.....	1
1.1. Destinatario inmediato.....	1
1.2. Destinatario final.....	1
1.3. Objeto.....	1
1.4. Alcance del trabajo de auditoría.....	1
1.5. Limitaciones al alcance.....	2
1.6. Tarea realizada.....	4
1.7. Indicadores.....	7
1.8. Análisis comparativo.....	8
1.9. Información adicional.....	9
1.10. Opinión del Auditor.....	17
1.11. Recomendaciones.....	18
1.12. Anexo I.....	21





"2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

1. Informe Analítico

1.1. Destinatario inmediato

A los Sres. Auditores Fiscales A/C de la Delegación TCP-PE, C.P. María Paula PARDO, C.P. Sebastian ROBELIN y C.P. Leonardo VIVAS AHUMADA.

1.2. Destinatario final

Al Sr. Secretario Contable A/C C.P. David R. BEHRENS.

1.3. Objeto

El presente informe consiste en el control de las partidas presupuestarias 3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificios y locales y 4.2 Construcciones, en el marco de la cuenta de inversión del ejercicio económico 2021 correspondiente al Poder Ejecutivo, conforme lo dispuesto en el artículo 166, apartado 4) de la Constitución Provincial, artículo 92 de la Ley Provincial N.º 495 y artículo 2º inciso e) de la Ley Provincial N.º 50 y sus modificatorias.

Las partidas presupuestarias 3.3.1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales y 4.2 Construcciones se exponen en el cuadro N.º 8 Ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial, según lo dispuesto en la Resolución de Contaduría General N.º 163/22.

1.4. Alcance del trabajo de auditoría

La tarea fue realizada desde el 29/04/2022 hasta el 10/06/2022, fecha de finalización de las tareas de campo, aplicándose los procedimientos de auditoría de acuerdo con el siguiente marco normativo u otros que se consideren necesarios:

- Manual Cuenta de Inversión.
- Resolución Plenaria N.º 15/2002.
- Resolución Plenaria N.º 243/05.
- Resolución Técnica N.º 37, modificada por la Resolución Técnica N.º 53, emitidas por la FACPCE, en lo que fuera de aplicación.
- Recomendaciones Técnicas N.º 1, N.º 2 y N.º 3 emitidas por la FACPCE en lo que fueran de aplicación.

Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer con un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada, considerada en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos. Los procedimientos de auditoría son empleados sobre las afirmaciones de mayor importancia relativa, para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, a los fines de contar con elementos de juicio válidos para opinar sobre la razonabilidad de los datos contenidos en la información examinada objeto de esta auditoría.

1.5. Limitaciones al alcance

No obstante lo expresado anteriormente, a continuación se exponen las limitaciones al alcance, circunstancias atribuibles al auditado o condicionantes externos que limitaron el desarrollo del trabajo de auditoría, que implicaron salvedades o imposibilitaron la emisión de una opinión:

- Habiéndose remitido en fecha 29/04/2022 las Notas Externas N.º 1017/2022, N.º 1018/2022 y N.º 1019/022 Letra: TCP-AOP a los Ministerios de Educación, Salud y Obras Públicas, respectivamente, el Ministerio de Salud ha aportado de modo completo y oportuno la información solicitada. Por su parte el Ministerio de Educación no ha dado respuesta a lo solicitado. Finalmente, y luego de efectuar pedidos de



"2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

prórroga, el Ministerio de Obras Públicas ha dado respuesta con fecha 08/06/2022 mediante la remisión del Informe N.º 14/2022 Letra: M.O. y S.P.

- Del análisis de la información remitida por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se verificaron diferencias y falta de información, en especial en comparación con la información obtenida del sistema GEN Financiero. Por lo que, a los fines de suplir dicha falta de información se ha utilizado a modo complementario los datos aportados en virtud del Plan Anual de Auditoría 2021, dando especial relevancia al mes de diciembre 2021. No obstante ello, cabe destacar que dicha información frecuentemente resulta incompleta e inconsistente.
- En cuanto a la ejecución presupuestaria correspondiente al inciso 3.3.1 del Poder Ejecutivo Provincial, no se pudo verificar el crédito original, modificaciones presupuestarias y crédito vigente, debido a que tanto el Decreto N.º 05/2021, como las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas, efectúan la distribución del crédito a nivel global del inciso 3, sin segregar los mismos a nivel de partida. A su vez, la consulta de ejecución presupuestaria completa, incluyendo desde el crédito original hasta el saldo no ejecutado, al delimitar la misma por la clasificación presupuestaria 30310 (Partida 3.3.1.) no arrojó resultado alguno, debiéndose recurrir a otros reportes, sin posibilidad de consultar los créditos presupuestarios, para obtener la información necesaria. En virtud de la falta de información y la escasa relevancia de la partida 3.3.1. respecto del gasto total, es que no se analizará su ejecución presupuestaria.
- En el sistema GEN Financiero, al asignar UGC a las diferentes obras las áreas involucradas han tendido a utilizar una misma unidad para una plétora de obras, incluso utilizando nombres generales que pueden no

representar algunas de las obras incluidas en el mismo. Ambas circunstancias dificultan el cruce de datos y la identificación de las obras en el sistema GEN Financiero.

1.6. Tarea realizada

El examen fue realizado aplicando los procedimientos de auditoría detallados en el Manual de la Cuenta de Inversión, a efectos de reunir los elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar la formación de la opinión sobre la ejecución presupuestaria de las partidas presupuestarias 3.3.1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales y 4.2 Construcciones de la cuenta de inversión del ejercicio 2021.

En el siguiente cuadro, se extracta del cuadro N.º 1 y 8 Ejecución presupuestaria de gastos, la información correspondiente a las partidas presupuestarias bajo análisis, sobre los cuales se aplicaron los procedimientos de auditoría antes descriptos.

Partida	Crédito original	Aumentos	Disminuciones	Crédito vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955.650,03	7.735.650,03	4.661.125,03
4.2	4.757.710.368,83	6.407.067.381,42	6.291.356.366,77	4.873.421.383,48	2.672.070.992,10	1.503.106.895,85	1.349.474.549,97

Inciso 4.2 – Construcciones

Crédito original:

Análisis: Se procedió a verificar el Crédito Original consignado en el Decreto Provincial N.º 05/2021, por medio de la cual se aprueba la distribución presupuestaria para el Ejercicio Económico 2021 del Poder Ejecutivo con las sumas expuestas en el cuadro N.º 1, como así también con el reporte “Ejecución Presupuestaria al 31/12/2021” del Sistema GEN Financiero.



"2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Conclusión: Dicha comparación arrojó resultados favorables.

Modificaciones presupuestarias:

Análisis: Se verificó la correspondencia del total de aumentos y disminuciones expuestos en el Estado de Ejecución Presupuestaria por Objeto (Cuadro N°1) con los datos obtenidos del sistema GEN Financiero, verificando un aumento de \$6.407.067.381,42 y una disminución de \$6.291.356.366,77, verificando un aumento neto de \$115.711.014,65. Se procedió al análisis de los actos administrativos que autorizaron incrementos y/o disminuciones de créditos presupuestarios aprobados, obteniendo resultados parciales en función de la falta de integridad de la información remitida por los Ministerios.

Conclusión: La comparación efectuada arrojó resultados favorables, aunque la documentación remitida no resultó suficiente a fin de validar la totalidad de las modificaciones presupuestarias.

Crédito vigente:

Análisis: Se cotejaron los montos reportados por el Sistema GEN Financiero con las modificaciones en dicho sistema detallado y los saldos de crédito original.

Conclusión: Dicha comparación arrojó resultados favorables.

Compromiso:

Análisis: Se cotejaron los montos expuestos en los Cuadro N.º 1 y 8 correspondientes a la Ejecución Presupuestaria de Gastos, con los obtenidos del sistema informático en su Informe "Ejecución Presupuestaria al 31/12/2021", verificando a su vez la integridad de dicha

información a través de los registros individuales de Compromisos Presupuestarios en el sistema.

Se ha verificado, respecto a las partida bajo análisis, que el monto comprometido no supera al crédito vigente.

Conclusión: Dicha comparación arrojó resultados favorables.

Devengado:

Análisis: Se cotejaron los montos expuestos en los Cuadro N.º 1 y 8 correspondientes a la Ejecución Presupuestaria de Gastos, con los obtenidos del sistema informático en su Informe “Ejecución Presupuestaria al 31/12/2021”, verificando a su vez la integridad de dicha información a través de los registros individuales de Devengados Presupuestarios en el sistema.

Se han identificado los expedientes involucrados en la ejecución presupuestaria según la información aportada por los Ministerios.

Se ha verificado, respecto a la partida bajo análisis, que el monto devengado no supera al comprometido.

Conclusión: Si bien dicho control arrojó resultados favorables, al constatar si dicha información coincide con la suministrada durante el ejercicio 2021, respecto al Plan Anual de Auditoría establecido en la Resolución Plenaria N.º 06/2020, “S/PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL 2020”, corresponde indicar que se han verificado expedientes involucrados en la ejecución que no han sido informados a este Grupo Especial de Obras Públicas en el marco de lo establecido en la Resolución precedentemente indicada. Por otro lado, al relevar la información remitida por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos mediante Informe



"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Nº14/2022 Letra: M.O. y S.P., se verificó que la misma resulta incompleta e inexacta, al no poder ser contrastada íntegramente con la información presupuestaria obtenida del sistema GEN Financiero.

Al respecto la suma informada por el Ministerio de Obras Públicas, principal ejecutor de la partida, es menor a lo verificado en el sistema GEN en tanto sobre un total de \$1.408.054.216,66 devengado por éste informó \$1.298.425.884,80, no habiéndose reportado \$109.628.334,86 (7,79%) a este Grupo Especial de Obra Pública. Idéntica situación ocurre con lo Pagado, en tanto sobre \$1.255.711.018,14 ha reportado sólo \$498.799.005,27, es decir \$756.912.012,87 no han sido informados (60,28%).

Pagado:

Análisis: Se cotejaron los montos correspondientes al sistema informático en su Informe "Ejecución Presupuestaria al 31/12/2021" y los datos informados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas.


Se ha verificado, respecto a las partidas bajo análisis, que el monto pagado no supera al devengado.

Conclusión: Dicha comparación arrojó resultados favorables.

1.7. Indicadores

Dado que el control de la cuenta de inversión consiste en comparar el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo con la ejecución de dicho presupuesto, se debe marcar en forma clara y contundente las evidencias de desvíos hallados de dicha comparación.

4.2 - Construcciones					
Devengado	1.503.106.895,85	= 31,59 %	Devengado	1.503.106.895,85	= 30,84 %
Créd. Original	4.757.710.368,83		Créd. Definitivo	4.873.421.383,48	

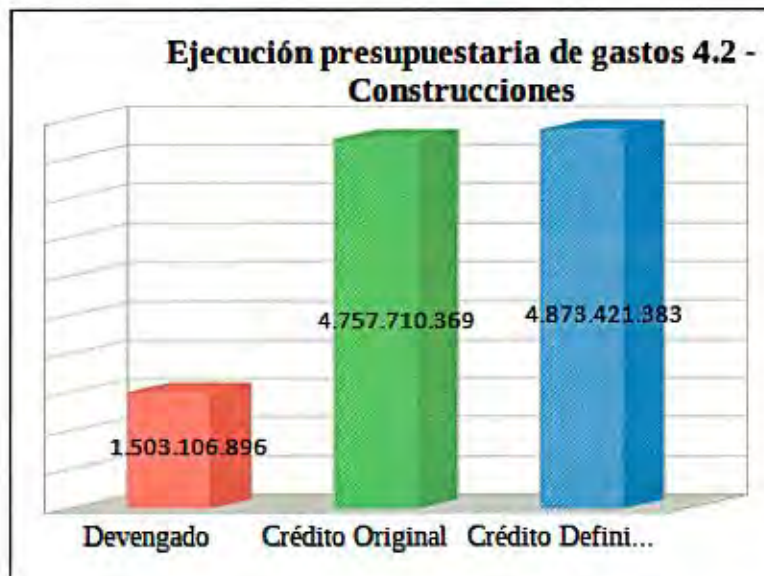

1.8. Análisis comparativo


A continuación, se realiza un análisis comparativo del monto devengado y crédito vigente de la partida presupuestaria 4.2, expuesta en el cuadro N.º 1 Ejecución presupuestaria de gastos por objeto del ejercicio 2021, con respecto al ejercicio inmediato anterior.

GASTOS	Ejercicio 2021			Ejercicio 2020		
	Devengado	Crédito Vigente	%	Devengado	Crédito Vigente	%
4. Bienes De Uso						
4.2. Construcciones	1.503.106.895,85	4.873.421.383,48	30,84 %	613.698.457,64	4.736.291.309,77	12,96 %



"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Ejecución presupuestaria de gastos 4.2 - Construcciones

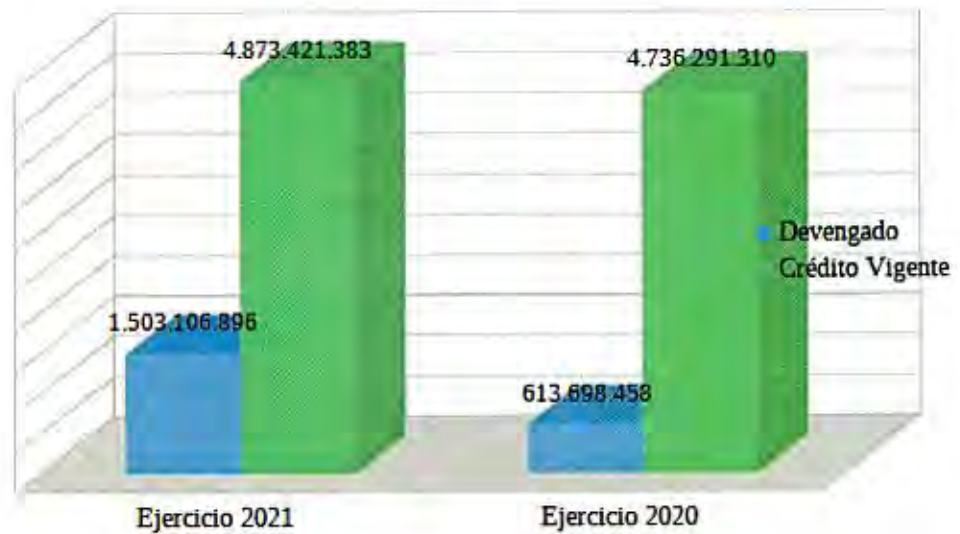

1.9. Información adicional

Se realiza en este apartado un análisis global de las obras relevantes ejecutadas por parte de los ministerios auditados, a los efectos de brindar información sobre el estado y avance de las mismas, fondos que la financian y toda otra consideración pertinente, a fin de emitir una opinión respecto a la ejecución presupuestaria de las partidas presupuestarias 3.3.1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales y 4.2 Construcciones, de la cuenta de inversión del ejercicio 2021.

Como se indicara previamente, la falta de información integral brindada en el marco de la presente Cuenta de Inversión significó la no disponibilidad de datos, como lo es por ejemplo el avance de obra al 31/12/2021. Motivo de ello se recurrió a la información aportada en el marco del Plan de Auditoría 2021, la cual suele contener errores o inconsistencias. Se ha indicado

con las siglas S/I (sin información) los casos donde no se logró obtener por medios alternativos el dato necesario. También cabe aclararse que en los casos que hubo discrepancias en estado declarado de la obra (ej. FINALIZADA) y el grado de avance final se ha tomado esta primera interpretación.

Cabe destacar en primer punto que solamente el Ministerio de Salud (0,19%), el Ministerio de Educación (6,13%) y el Ministerio de Obras Públicas han devengado a la partida 4.2 Construcciones, correspondiendo la mayor parte a éste último (93,68%).

Organismo	Preventivo	Compromiso	Devengado	Mandado a Pagar	Pagado
Ministerio de Obras y Servicios Públicos	3.745.398.274,52	2.574.955.389,32	1.408.054.219,66	1.300.437.700,47	1.255.711.018,14
Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología	127.903.828,00	94.251.012,62	92.188.086,03	90.898.932,67	90.898.932,67
Ministerio de Salud	3.063.950,98	2.864.590,16	2.864.590,16	2.864.590,16	2.864.590,16
Total Poder Ejecutivo	3.876.366.053,50	2.672.070.992,10	1.503.106.895,85	1.394.201.223,30	1.349.474.540,97

En lo que respecta al Ministerio de Salud, es dable destacar que no ha ejecutado per se obra pública, sino que ha realizado la compra de materiales y la contratación de mano de obra para la realización de tareas de mantenimiento de instalaciones sanitarias. La totalidad de dicho gasto (\$2.864.590,16) ha sido financiado por el Fondo Financiamiento Servicios Sociales (Ley Provincial N.º 907).

Obras (F.F. Servicios Sociales)	Devengado
Insumos para Obras - Ministerio de Salud	2.864.590,16

Por el lado del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se verifica la realización de seis obras vinculadas a programas de financiamiento nacional, a lo cual responde la totalidad del gasto devengado de \$92.188.086,03.



"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Obras (Transferencias Gobierno Nacional)	Devengado	Avance Real al 31/12/2021	Avance Previsto al 31/12/2021
Acondicionamiento de Baños en Escuela Provincial N° 2 Benjamín Zorrilla - Río Grande	3.801.923,59	S/I	S/I
Ampliación y Refuncionalización Colegio Provincial Los Andes - Ushuaia	608.742,66	35,00 %	35,00 %
Jardín a Crear en Barrio Malvinas Argentinas - Ushuaia	46.540.897,52	100,00 %	100,00 %
Jardín a Crear en Urbanización Río Pipo - Ushuaia	38.145.440,28	100,00 %	100,00 %
Jardín de Infantes N° 24 Andorra - Ushuaia (Redeterminación de Precios)	1.448.072,71	100,00 %	100,00 %
Reparación Cisterna Exterior en Colegio Provincial Cte. Luis Piedrabuena - Río Grande	1.643.009,27	100,00 %	100,00 %

En cuanto al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, cabe destacar que la mayoría de su gasto devengado ha sido afrontado con los fondos obtenidos en virtud del Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Tierra del Fuego, aprobado por Ley provincial N.º 1.132, determinando posteriormente las obras a ser realizadas con dichos fondos de acuerdo a lo establecido en las Leyes provinciales N.º 1.142, 1.149, 1.180, 1.235 y 1.312, totalizando dicho gasto la suma de \$1.334.750.951,66. Se incorpora el detalle de obras como Anexo I del presente informe.

En la misma cartera y en segundo orden de importancia destacan las Traslaciones del Gobierno Nacional, las cuales para el M.O.yS.P. suman un total devengado durante 2021 de \$71.392.436,85.

Obras (Transferencias Gobierno Nacional)	Devengado	Avance Real al 31/12/2021	Avance Previsto al 31/12/2021
Alimentación de Red de Gas Natural Barrio El Mirador - Ushuaia	9.634.074,85	100,00 %	100,00 %
Mejoramiento Barrio Arraigo Sur - Redes de Agua y Cloaca - Río Grande	61.758.362,00	S/I	S/I

Por último este Ministerio posee devengados durante 2021 un total de \$1.910.831,15 que se afrontaron con fondos del Tesoro Provincial.

Obras (Fondos Provinciales)	Devengado	Avance Real al 31/12/2021	Avance Previsto al 31/12/2021
Mantenimiento Correctivo Urgente en Casa de Servicio CADIC afectado a Casa de Gobierno - Ushuaia	324.443,69	100,00 %	100,00 %
Muro de contención en Muelle de pescadores Artesanales - Ushuaia (Redeterminación de Precios)	467.289,55	13,46 %	13,46 %
Oxígeno Polo Sanitario Cochoco Vargas - Ushuaia (Adicional)	46.000,00	S/I	S/I
Refacción Cubierta de Techo Acceso Museo - Ushuaia	118.480,00	S/I	S/I
Refacciones en la Oficina de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor - Ushuaia (Redeterminación de Precios)	252.307,41	S/I	S/I
Trabajos en CAPS y HRU - Ushuaia	702.310,50	S/I	S/I

Bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas, aunque con un tratamiento patrimonial separado se encuentra el Fideicomiso de Responsabilidad Social Empresaria. Durante el ejercicio 2021 se ha devengado un total de \$10.787.498,70 correspondientes al “Gimnasio del Instituto María Auxiliadora Río Grande” y al “Nuevo Edificio Central de Comunicaciones”.


Obras (Fondos Provinciales)	Devengado	Avance Real al 31/12/2021	Avance Previsto al 31/12/2021
Gimnasio Instituto Maria Auxiliadora - Río Grande	6.891.969,30	75,88 %	78,65 %
Nuevo Edificio Central de Comunicaciones	3.895.529,40	S/I	S/I

Respecto a los fondos devengados en materia del inciso 4.2 cabe destacar sobre su financiamiento que un 88,71% ha respondido a los fondos obtenidos en función de la emisión de los Bonos Fuego 2027 mientras que un 10,98% fueron obtenidos a través de Transferencias del Gobierno Nacional. Finalmente un 0,19% provino del Fondo Financiamiento Servicios Sociales (Ley Provincial N.º 907) y un 0,13% del Tesoro Provincial.



"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Financiamiento	Compromiso		Devengado		Pagado	
	Monto	Incidencia	Devengado	Incidencia	Pagado	Incidencia
Bonos Fuego 2027	2.247.485.430,78	84,11 %	1.333.338.154,57	88,71 %	1.183.220.456,96	87,68 %
Transferencias Gobierno Na	416.108.559,98	15,57 %	164.993.319,97	10,98 %	161.730.970,11	11,98 %
Fondos Provinciales	1.910.831,19	0,07 %	1.910.831,15	0,13 %	1.658.523,74	0,12 %
F.F. Servicios Sociales	6.566.170,15	0,25 %	2.864.590,16	0,19 %	2.864.590,16	0,21 %
Total	2.672.070.992,10	100,00 %	1.503.106.895,85	100,00 %	1.349.474.540,97	100,00 %

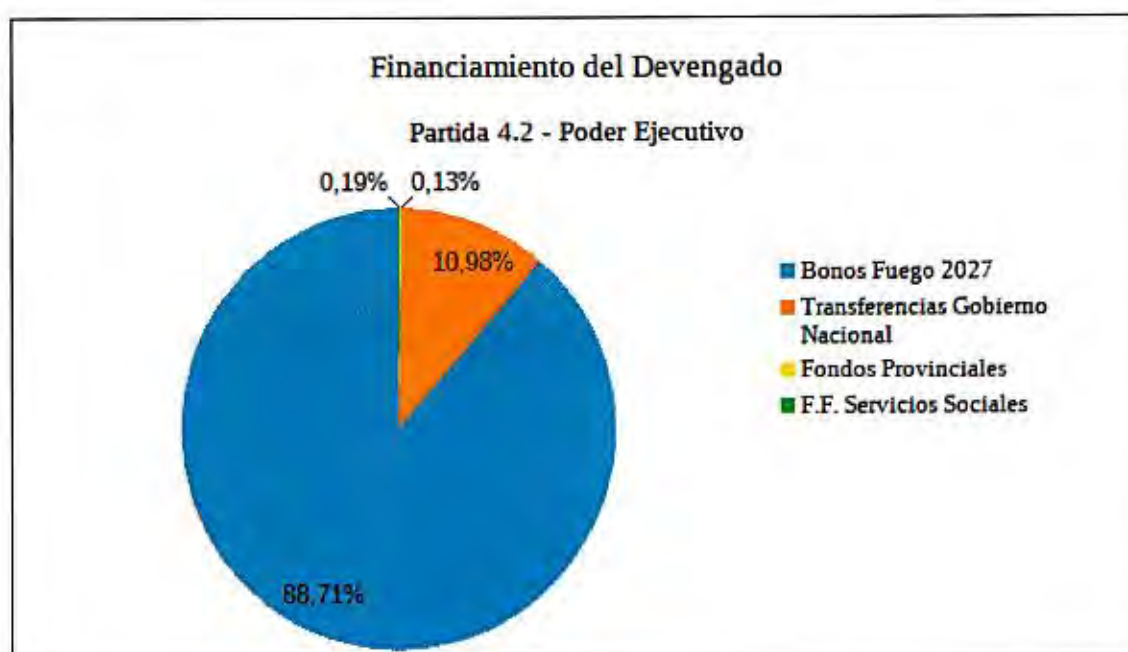

En cambio, en lo que refiere a la partida 3.3.1 es predominante el aporte del Tesoro Provincial, el cual alcanza un 91,66% de los montos devengados, mientras que completan el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (Ley 907) con un 7,70% y Otras Fuentes con un 0,62%.

Financiamiento	Devengado		Pagado	
	Devengado	Incidencia	Pagado	Incidencia
Tesoro Provincial	7.055.870,03	91,21 %	3.986.845,03	85,53 %
FF. Servicios Sociales	628.950,00	8,13 %	623.450,00	13,38 %
Otros	50.830,00	0,66 %	50.830,00	1,09 %
Total	7.735.650,03	100,00 %	4.661.125,03	100,00 %



Como punto importante dentro del análisis de la ejecución de obra pública correspondiente al Ejercicio 2021 es dable indicar que este Grupo Especial de Obra Pública ha intervenido en 54 contrataciones/adjudicaciones, de las cuales 18 corresponden a una instancia de control preventivo y 36 a control posterior. Dichas actuaciones significaron un monto total intervenido de \$2.186.604.313,91, repartido en \$1.852.704.986,92 y \$333.899.326,99 respectivamente.

Intervenciones Control Preventivo			Año de Intervención	Campaña 2021
Año	Expendio	Obras		
004	25224-MO-2020	Nueva Guardia de Emergencia del Hospital Regional de Rio Grande - Remodelación y Reubicación	66.259.875,03	76.198.856,28
010	46864-MO-2020	Construcción de Estacionamiento Av. San Martín y Av. Prefectura Naval	11.482.830,63	11.482.830,63
013	52475-MO-2020	Centro de Rehabilitación Ushuaia	435.420.705,79	265.050.906,74
020	30815-MO-2020	Relaciones del edificio II de la división Institutos Policiales	18.723.797,71	18.723.797,71
021	33979-MO-2020	Accesibilidad, ascensores y relaciones interiores Casa de Gobierno - Av. San Martín N.º 450	31.006.800,00	31.006.800,00
024	52244-MO-2020	Relaciones Interiores Dependencias Varas Casa De Gobierno - Av. San Martín N.º 450	25.352.432,00	25.352.432,00
031	7070-MO-2021	Mantenimiento y Reparaciones: Escuela N.º 9 - Escuela N.º 24 - Escuela N.º 36	7.357.325,00	7.357.325,00
032	8106-MO-2021	Mantenimiento y Reparaciones Escuela Especial N.º 1 Kayu Cheren	8.785.630,89	8.785.630,89
033	10644-MO-2021	Obras Varas - Conexiones Domiciliarias	300.171.254,77	193.521.210,22
034	54101-MO-2020	Reparación y Mantenimiento Gimnasio Colegio Provincial José Sobral	5.715.520,85	5.715.520,85
035	5184-MO-2021	Mantenimiento exterior de edificios públicos de la ciudad de Ushuaia	14.630.619,15	14.630.619,15
036	8454-MO-2021	Gimnasio Deportivo Ushuaia	284.263.348,50	198.904.343,95
045	27658-MO-2021	Ampliación Centro Polivalente de Arte Prof. Inés María Bustelo - Ushuaia	100.016.497,88	75.012.373,41
047	28431-MO-2021	Construcción de Consigna Bº San Vicente de Paul - Ushuaia	34.860.000,00	17.778.600,00
075	75837-MO-2021	AMPLIACION HOSPITAL REGIONAL USHUAIA	449.472.585,84	272.840.411,30
078	62162-MO-2021	Proyecto Ejecutivo: Pavimentación Ruta Nacional N.º 3 - Tramo Av. Alem - Portal Parque Nacional T.D.F.	7.000.000,00	7.000.000,00
079	61567-MO-2021	Obra Complementaria Extensión de Acueducto y Construcción de 4º Veredero de la obra Plan de Restauración y Remedación Hidroambiental de la Laguna de los Cisnes a cargo de la empresa Nakon Sur SA	35.651.177,49	35.651.177,49
081	48523-MO-2021	Relaciones Radio Fundación Austral - 60 Viviendas Tea 2 Casa 12 - Ushuaia	6.534.497,39	6.534.497,39
TOTALES			1.852.704.986,92	1.271.827.341,06



"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Intervenciones Control Posterior				
Acta	Expediente	Obra	Monto Intervenido	Compromiso 2021
006	14529-ED-2019	Anexo Jardín de Infantes N.º 5 - Tol Ojece - T.D.F. - Plan 3000 Jardines	28.958.401,60	0,00
007	14285-ED-2019	Jardín a crear en Malvinas Argentinas (Ushuaia) - T.D.F. - Plan 3000 Jardines	41.802.393,83	46.594.407,50
076	26477-MO-2020	Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 12 RG	4.022.601,96	4.022.601,96
077	43482-MO-2020	Construcción de Plataea y Obras Complementarias - Centro Modular Sanitario para lugares turísticos	22.100.000,00	15.470.000,00
078	1082-MO-2020	Mantenimiento y reparaciones Escuela Provincial Especial N.º1 Kayu Chenen Ushuaia	2.836.800,00	2.836.800,00
086	3366-MO-2020	Mantenimiento correctivo Escuela Provincial N.º 32 de la ciudad de Río Grande	1.500.983,64	1.500.983,64
089	26504-MO-2020	Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 02 RG	5.626.492,75	5.626.492,75
090	26506-MO-2020	Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 07 RG	3.940.432,04	3.940.432,04
091	26510-MO-2020	Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 06 RG	4.803.753,24	4.803.753,24
092	26512-MO-2020	Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 03 RG	3.808.073,08	3.808.073,08
093	26514-MO-2020	Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 09 RG	3.991.511,80	3.991.511,80
094	15239-MO-2021	Mantenimiento exterior de edificios públicos de la ciudad de Ushuaia	2.551.500,00	2.551.500,00
102	13194-MO-2019	Relaciones de Oficina de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor	2.499.970,00	2.499.970,00
124	24842-MO-2020	Instalación y puesta en marcha del Grupo Generador de Energía Eléctrica HRRG	8.891.112,50	8.891.112,50
125	1804-MO-2020	Mantenimiento y retacciones escuela provincial n.º 13 "Almirante Brown Ushuaia"	3.870.410,41	3.870.410,41
129	10275-MO-2021	Pintura Exterior Escuela Provincial N.º 7	1.185.879,85	1.185.879,85
135	7784-MO-2020	Trabajos de Urgencia pimedrias en bioseguridad en CAPS Zona sur y área de terapia intensiva H.R.U.	2.715.750,00	2.715.750,00
142	18566-MO-2020	Reparación y Mantenimiento Gimnasio Ana Giro - 245 Viviendas	3.956.922,29	3.956.922,29
152	31741-MO-2020	Nueva Instalación de Gas Aulas para el Servicio Penitenciario D.P.O.S.S.	3.831.050,97	3.831.050,97
157	22166-MO-2020	Refuncionalización y ampliación sector de Neonatología H.R.U.	5.590.119,18	5.590.119,18
171	3444-MO-2020	Mantenimiento y Reparaciones Esc. Pcial. N.º 30 - Ostrovia	3.045.483,00	3.045.483,00
174	235-MO-2020	Mantenimiento Correctivo Colegio Polivalente de Arte Jardín de Infantes N.º 5 Río Grande	3.831.050,97	3.831.050,97
191	7962-MO-2021	Mantenimiento y reparaciones IPES - COLEGIO KLOKETEN - JARDIN N.º 19 - USHUAIA	2.250.599,76	2.250.599,76
194	18565-MO-2020	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GIMNASIO 640 VIVIENDAS USH	4.286.644,13	4.286.644,13
202	36702-MO-2021	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CALEFACCION DESTINADOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE USHUAIA	8.142.044,00	8.142.044,00
203	9371-MO-2021	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO PROVINCIAL "ERNESTO SARATO" COLEGIO PROVINCIAL "LOS ANDES" - USHUAIA.	4.137.089,21	4.137.089,21
204	8758-MO-2021	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA	12.399.375,00	7.429.625,00
208	8613-MO-2021	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESC. N.º 41 Y JARDIN N.º 7 USHUAIA	6.576.842,78	5.146.106,67
209	8889-MO-2021	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESCUELA N.º 16 DR. ARTURO MATEO BAS, ESCUELA N.º 40 MARIA ELENA WALSH Y JARDIN N.º 20 LUCERITO DE FUEGO	7.366.899,39	4.420.129,64
225	25050-MO-2021	ADQUISICION DE CALDERAS PARA COLEGIO PROVINCIAL ANTIARJIDA ARGENTINA	1.220.000,00	1.223.228,16
280	9401-MO-2021	OBRAS COMPLEMENTARIAS GIMNASIO DEPORTIVO - ESCUELA PROVINCIAL N.º 31 JUANA MANSO - USHUAIA	13.354.200,07	9.047.940,05
274	50126-MO-2021	AMPLIACION ESCUELA N.º 47 Y COLEGIO ANTONIO MARTE - USHUAIA	58.165.430,47	21.986.521,38
290	12668-MO-2021	AMPLIACION DE AULAS ESC. N.º 44 VALIENTES DE MALVINAS - RIO GRANDE	19.636.050,56	15.708.840,45
281	53743-MO-2021	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CLOACAL DE EDIFICIO PUBLICOS" - RIO GRANDE - 2021	23.327.756,76	23.327.756,76
285	20617-MO-2021	OBRA POR ADMINISTRACION: PINTURA DE PUERTAS INTERIORES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO B	3.316.731,75	3.316.731,75
286	29104-MO-2021	OBRA POR ADMINISTRACION: PINTURA DE PUERTAS INTERIORES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS GRUPO B	1.561.000,00	1.561.000,00
TOTALES			333.899.326,98	247.666.571,14

A su vez, es dable destacar que dichas intervenciones responden a compromisos presupuestarios durante el ejercicio 2021 por un total de \$1.519.283.912,20. Considerando un valor de \$2.672.070.992,10 en compromisos durante el Ejercicio 2021 ello significa que se ha intervenido durante el ejercicio un 56,86% del gasto total comprometido.

Tipo	Monto Intervenido	Compromiso 2021
Preventivo	1.852.704.986,92	1.271.627.341,06
Posterior	333.899.326,99	247.656.571,14
Total	2.186.604.313,91	1.519.283.912,20
Compromisos s/GEN		2.672.070.992,10
Proporción Intervenido	A / B = %	56,86 %

Por otro lado, resulta relevante indicar que como se indicara en las aclaraciones previas y a través del análisis de la ejecución del gasto, los organismos han presentado imprecisiones, inconsistencias y falta de datos en los reportes brindados a este Grupo Especial de Obra Pública en virtud del Plan Anual de Auditoría. Tomando al Ministerio de Obras Públicas como ejemplo se verifica a continuación la magnitud de dichas carencias.

Concepto	Devengado	Pagado
Certificado de Obra	857.201.167,12	452.696.969,76
Certificado de Redeterminación	441.224.717,68	46.102.035,51
Totales informados durante 2021	1.298.425.884,80	498.799.005,27
Devengado y Pagado s/GEN	1.408.054.219,66	1.255.711.018,14
Diferencia	A - B = C	- 756.912.012,87
Incidencia	C / B = %	-60,28 %

En cuanto al gasto devengado en concepto de Anticipo Financiero a contratistas de obra pública, se pudo contrastar la información registrada en el sistema GEN Financiero, con aquella aportada en el marco del Plan Anual de Auditoría y los procedimientos de control realizados. De los datos obtenido del sistema, el devengamiento y pago en Concepto de Anticipos Financieros de Obra



"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Pública correspondiente a la RAF 111 totaliza la suma de \$624.102.064,07; mientras que de la información relevada durante el año se obtuvo un total devengado de \$623.552.291,18, obteniendo una diferencia de \$549.772,89, la cual representa un 0,09% del total devengado. No obstante, resulta importante aclarar que el gasto devengado no pudo ser corroborado con la información remitida en el marco de la presente Cuenta de Inversión 2021, en tanto la misma resultó escasa e imprecisa.

En cuanto al Fideicomiso Austral, desde el Ministerio de Obras se informó que el contrato del Fideicomiso se encuentra finalizado el 22/03/2021, sin una prórroga, manteniendo un pasivo con el fiduciario por la suma total de \$3.855.906,75. Indicando a su vez que mediante el expediente E-12779/2022 se gestiona el pago de las facturas pendientes del periodo 2020 y 2021, de las cuales se adjunta copia. Por otra parte, en respuesta a lo solicitado, adjuntan los informes contables de los últimos dos trimestres de 2021, como así también la información mensual de Nación Fideicomiso S.A., con detalle de ingresos y egresos de la cuenta fiduciaria, y extractos bancarios. Por otro lado, respecto de los Fideicomisos de Obras I y II, no se remitió la información solicitada.

Se incorpora al presente, Informe Técnico N.º 090/2022 Letra: TCP-SC-GEOP-AT, respecto a las actuaciones y/o inspecciones realizadas en el ejercicio económico en el ejercicio bajo análisis.

1.10. Opinión del Auditor

Fundamento de la opinión con salvedad:

Habida cuenta de las limitaciones oportunamente listadas, no ha resultado posible realizar una correcta verificación de los créditos presupuestarios que responden a la partida 3.3.1. Se entiende en virtud de ello,

que dada la poca significatividad de los montos devengados y que los mismos no superan al crédito global para el inciso la opinión es favorable con la salvedad marcada.

Por el lado del inciso 4.2 Construcciones debe destacarse que atento a la remisión información insuficiente no ha sido posible cruzar el avance de obra con los valores devengados y pagados, existiendo una diferencia del 7,79% y del 60,28%, ambas en deficiencia, entre las operaciones informadas y las relevadas en el sistema informático. No obstante ello, es dable indicar que durante las intervenciones realizadas durante 2021 los montos devengados registrados en el sistema GEN se han correspondido con los avances de obra. Se entiende en virtud de ello, que la opinión es favorable con la salvedad marcada por la imposibilidad de corroborar la integridad de los montos devengados.

En nuestra opinión, excepto por lo expuesto en el párrafo de fundamentos de la opinión con salvedades, el estado de ejecución presupuestaria de gastos del ejercicio 2021 (cuadro N.º 1 y 8) del Poder Ejecutivo, presenta razonablemente, en sus aspectos significativos, la información referida al crédito original, modificaciones presupuestarias, crédito vigente, compromisos contraídos, devengado y pagado de las partidas presupuestarias 3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificios y locales y 4.2 Construcciones.

1.11. Recomendaciones

Realizado el análisis de la ejecución presupuestaria de las partidas presupuestarias 3.3.1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales y 4.2 Construcciones, se recomienda:



"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

- Sistematizar el reporte de información a los organismos de control, de modo de que la información brindada resulte clara, completa, íntegra y precisa entre lo actuado y lo vertido en el sistema GEN.
- A la hora de reportar datos de obra y de generar registros en el sistema informático corroborar la homogeneidad de la denominación de la obra.
- Evitar el uso de unidades de gestión de gasto y/o crédito de índole globalizadora, en especial aquellas que contengan gran cantidad de obras. En caso de resultar indispensable, se recomienda una agrupación que resulte intuitiva, precisa y práctica.

C.P. Esteban Sebastián TOVARES
Auditor Fiscal
Tribunal de Cuentas de la Provincia





"2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

1.12. Anexo I

Obras (Bonos Fuego 2027)	Devengado	Avance Real al 31/12/2021	Avance Previsto al 31/12/2021
Accesibilidad y Refacciones Interiores Casa de Gobierno - Ushuaia	18.542.980	59,80 %	67,16 %
Adecuación de ERP Barrio AGP, ERP Barrio Arraigo Sur y Ampliación de Capacidad de Transporte de Gas Margen Sur - Río Grande	601.411	100,00 %	100,00 %
Alimentación de Red de Gas Natural Barrio Arraigo Sur - Margen Sur - Río grande	33.569.205	88,95 %	86,74 %
Alimentación Red de Gas Barrio Akar - Ushuaia	3.610.963	72,17 %	68,79 %
Alimentación Red de Gas Natural Barrio Argentino - Margen Sur - Río Grande	3.960.637	100,00 %	100,00 %
Alimentación Red de Gas Natural Barrio Héroes de Malvinas - Margen Sur - Río Grande	1.346.531	100,00 %	100,00 %
Alimentación Red de Gas Natural Sector Andorra Barrios Ex Quinta 52, Cuesta del Valle y Barrio Itati - Ushuaia	16.260.068	75,90 %	78,31 %
Ampliación Centro Polivalente de Arte - Ushuaia	20.980.279	S/I	S/I
Ampliación de Aulas Escuela N.º 44 "Valientes de Malvinas" - Río Grande	6.044.562	S/I	S/I
Ampliación Escuela Alicia Moreau de Justo - RG	16.071.060	48,23 %	49,57 %
Ampliación Escuela Provincial N.º 20 Ángela Lotj - RG	22.074.870	74,26 %	74,60 %
Ampliación Jardín de Infantes N.º 27 - Río Grande	972.472	100,00 %	100,00 %
Ampliación Sector Neonatología del Hospital Regional Ushuaia	7.512.151	100,00 %	100,00 %
Ampliación SUM Escuela Provincial N.º 21	14.877.889	54,25 %	73,21 %

Ampliación y Refacción Colegio Provincial Cte. Luis Piedrabuena - RG	5.747.000	46,04 %	46,29 %
Ampliación y Refacción Escuela Provincial N° 10 General Manuel Belgrano - Río Grande (Redeterminación de Precios)	2.273.407	100,00 %	100,00 %
Ampliación y Refacción Escuela Provincial N°32 IYU "Que deja huella" - Río Grande	459.222	100,00 %	100,00 %
Cancelación de Factura a favor de la empresa MENESES por 600 horas de Servicio	2.220.000	100,00 %	100,00 %
Centro de Atención Segundo Nivel - Río Grande	5.677.035	100,00 %	100,00 %
Centro de frontera San Sebastián - Modulo de Egreso Departamento Río Grande	2.178.276	100,00 %	100,00 %
Centro Preventivo Asistencial Reencontrándonos	3.752.021	100,00 %	100,00 %
Colegio Provincial Dr. Laureano Maradona - RG	368.693	4,02 %	S/I
Comisaría Barrio San Vicente - Ushuaia	2.450.186	S/I	S/I
Complejo Deportivo Margen Sur - Río Grande	5.216.026	S/I	S/I
Conexiones Intradomiciliarias de Gas - Río Grande y Tolhuin	42.723.308	S/I	S/I
Construcción de Estacionamiento en Av. San Martín y Av. Prefectura Naval - Río Grande	12.440.091	S/I	S/I
Construcción de platea Centro Modular Sanitario - Ushuaia	21.017.260	15,65 %	8,00 %
Construcción de Red de Gas Barrio Provincias Unidas - Río Grande	19.909.916	65,37 %	62,15 %
Construcción Red de Gas Barrio 10 de Noviembre - Río Grande	5.857.752	100,00 %	100,00 %



"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Construcción Red de Gas Barrio 22 de Julio - Margen Sur - Río Grande	1.657.337	100,00 %	100,00 %
Construcción Red de Gas Barrio El Milagro - Margen Sur - Río Grande	1.164.014	100,00 %	100,00 %
Construcción Red de Gas Barrio Empleados de Comercio y Barrio Provincias Unidas - Tolhuin	20.603.948	S/I	S/I
Construcción Red de Gas Barrio Fueguinos - Margen Sur - Río Grande	608.711	100,00 %	100,00 %
Convenio para la Inspección de Obra y Mantenimiento de las Instalaciones: Interconexión Gasoducto San Martín y Gasoducto Fueguino e Instalación de la Planta Compresora Río Grande	18.000.000	S/I	S/I
Desarrollo Troncal Fibra Óptica	12.976.785	S/I	S/I
Desobstrucción de Líneas Cloacales - Tolhuin	4.059.200	S/I	S/I
Escuela Provincial N° 10 Manuel Beigrano - Río Grande	873.524	100,00 %	100,00 %
Escuela Técnica Margen Sur - RG	96.724.603	61,21 %	75,25 %
Gimnasio Club Social Deportivo y Cultural Luis Garibaldi	3.079.062	9,59 %	11,39 %
Gimnasio de la Escuela de Policía - Río Grande	17.429.117	97,97 %	97,56 %
Instalación Interna de Gas para Servicios Públicos ZS en calle Pujato 130 - Ushuaia	1.621.953	30,00 %	S/I
Instalación y Puesta en Marcha del Grupo Generador de Energía Eléctrica HRRG - Río Grande	8.891.113	S/I	S/I
Interconexión Gasoducto San Martín y Fueguino	63.872.708	7,73 %	2,50 %
Limpieza y Saneamiento del Predio de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos - Río Grande	5.529.902	S/I	S/I

Mantenimiento Correctivo Colegio Polivalente de Arte y Jardín de Infantes N° 5 - Río Grande	3.508.340	72,47 %	72,47 %
Mantenimiento Correctivo Colegio Provincial de Educación Técnica - Río Grande	3.248.243	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo Colegio Provincial Padre Zink - Río Grande	1.118.606	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo Colegio Provincial René Favaloro - Río Grande	2.252.183	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo Colegio Provincial Trejo Noel - Tolhuin	1.800.977	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo de Emergencia del Jardín N° 3 - Río Grande	879.315	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo de Emergencia Escuela Especial N° 3 - Río Grande	875.395	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo de Emergencia Escuela N° 42 Gabriela Mistral - Río Grande	547.585	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo de Emergencia Gimnasio Escuela N° 23 - Río Grande	4.154.266	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo de Emergencia Jardín de Infantes N° 17 - Ushuaia	394.190	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo en Escuela N° 30 - Ushuaia	3.510.402	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo en Escuela Provincial N° 32 - Río Grande	210.187	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo en Escuela Provincial N° 45 - Tolhuin	1.495.689	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo en Escuela Provincial N° 46 - Río Grande	1.434.593	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo Escuela N° 10 - Río Grande	3.690.040	S/I	S/I



"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Mantenimiento Correctivo Escuela N° 13 - Ushuaia	2.168.609	15,67 %	31,05 %
Mantenimiento Correctivo Escuela N° 34 - Ushuaia	1.200.392	86,49 %	100,00 %
Mantenimiento Correctivo Escuela N° 47 - Ushuaia	1.361.151	96,07 %	100,00 %
Mantenimiento Correctivo Jardín de Infantes N° 21 - Río Grande	909.501	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo Jardín N° 13 - Tolhuin	639.924	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo Jardín N° 23 - Tolhuin	2.581.411	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo Jardín N° 4 - Río Grande	959.641	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo Refacción Sistema de Calefacción e Instalación Sanitaria en Jardín N° 5 - Río Grande	2.898.139	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo Refacciones en Instalación Sanitaria y Calefacción en Escuela N° 14 - Río Grande	1.485.301	S/I	S/I
Mantenimiento Correctivo Wikam - Río Grande	2.451.071	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 1 - Río Grande	4.212.775	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 10 - Río Grande	4.229.997	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 11 - Río Grande	4.079.536	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 12 - Río Grande	3.419.212	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 13 - Río Grande	2.850.082	S/I	S/I

Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 14 - Río Grande	2.448.320	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 15 - Río Grande	3.774.501	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 16 - Río Grande	3.787.767	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 17 - Río Grande	4.162.497	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 18 - Tolhuin	3.939.777	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 19 - Tolhuin	4.171.968	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 2 - Río Grande	3.938.545	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 3 - Río Grande	3.940.432	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 4 - Río Grande	3.693.242	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 5 - Río Grande	3.309.280	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 6 - Río Grande	4.789.540	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 7 - Río Grande	3.808.073	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 8 - Río Grande	3.170.401	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo 9 - Río Grande	2.993.634	S/I	S/I
Mantenimiento Preventivo de Edificios Educativos Grupo N° 20 - Río Grande	2.890.646	S/I	S/I



"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Mantenimiento y Conservación Cloacal de Edificios Públicos - Río Grande	1.665.551	S/I	S/I
Mantenimiento y Refacción en Escuela N° 1 Domingo Faustino Sarmiento - Ushuaia	1.405.371	100,00 %	100,00 %
Mantenimiento y Refacción en Escuela N° 39 - Ushuaia	1.687.818	35,75 %	88,97 %
Mantenimiento y Refacción en Escuela N° 41 y Jardín N° 7 - Ushuaia	6.079.777	34,95 %	80,21 %
Mantenimiento y Reparación en Colegio Provincial Ernesto Sábató y Colegio Provincial Los Andes - Ushuaia	3.798.052	91,80 %	91,80 %
Mantenimiento y Reparación Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados - Ushuaia	3.943.955	76,99 %	76,99 %
Mantenimiento y Reparación Centro Educativo de Formación Laboral - Ushuaia	937.952	74,45 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Colegio Ernesto Sábató - Ushuaia	4.774.600	100,00 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Colegio José María Sobral - Ushuaia	2.472.003	78,60 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Colegio Kloketen	1.418.060	S/I	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Colegio Los Andes - Ushuaia	1.561.904	100,00 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Colegio Provincial Polivalente de Arte - Ushuaia	4.488.156	72,47 %	72,47 %
Mantenimiento y Reparación en el Colegio José María Sobral - Ushuaia	1.678.124	50,32 %	44,50 %
Mantenimiento y Reparación en el Gimnasio de la Escuela Provincial N° 15 - Ushuaia	3.953.492	20,02 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación en el Gimnasio del Centro Polivalente de Arte - Río Grande	2.971.212	S/I	S/I

Mantenimiento y Reparación en el Jardín N° 18 - Ushuaia	66.354	5,59 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Escuela Especial N° 1 Kayu Chenen	5.713.524	S/I	S/I
Mantenimiento y Reparación Escuela Especial N° 1 Kayu Chenen - Ushuaia	1.445.796	51,46 %	81,88 %
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 13 Almirante Brown - Ushuaia	4.713.539	15,67 %	31,05 %
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 16, Escuela N° 40 y Jardín N° 20 - Ushuaia	7.236.559	40,00 %	S/I
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 22 - Ushuaia	702.754	99,15 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 34 y Escuela N° 3 - Ushuaia	3.061.534	96,80 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 40 - Río Grande	227.991	100,00 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 41 - Ushuaia	639.203	98,04 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 9 - Ushuaia	3.143.686	86,93 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Escuela N° 9, Escuela N° 24 y Escuela N° 30 - Ushuaia	3.937.049	67,66 %	75,84 %
Mantenimiento y Reparación Escuela Provincial Entre Ríos - Ushuaia	478.724	100,00 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Escuela Provincial N° 15 Centenario - Ushuaia	1.562.901	S/I	S/I
Mantenimiento y Reparación Escuela Provincial N° 16 - Ushuaia	953.623	S/I	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Escuela Provincial N° 31 - Ushuaia	775.224	15,09 %	100,00 %



"2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Mantenimiento y Reparación IPES - Ushuaia	777.186	15,93 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación IPES, Colegio Kloketen y Jardín N° 19 - Ushuaia	2.250.600	47,00 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Jardín N° 10 - Ushuaia	15.250	98,43 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Jardín N° 14 Caramelos Surtidos - Ushuaia	825.971	16,69 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Jardín N° 20 Lucerito de Fuego - Ushuaia	100.570	83,93 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Jardín N° 24 de Andorra - Ushuaia	853.785	10,30 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Jardín N° 7 Piedra Libre - Río Grande	1.751.401	56,09 %	100,00 %
Mantenimiento y Reparación Jardín N° 8, Escuela N° 39 y Escuela Experimental los Calafates - Ushuaia	3.069.660	S/I	S/I
Mejoramiento Barrio Arraigo Sur - Redes de Agua y Cloaca Río Grande (Redeterminación de Precios)	54.476.699	S/I	S/I
Microestadio cubierto ciudad de Río Grande - RG	148.812.802	80,40 %	S/I
Normalización de Instalación de Gas Escuela N° 8 - Río Grande	1.685.938	S/I	S/I
Nueva Guardia de Emergencia del Hospital Regional de Río Grande	25.505.234	S/I	S/I
Nueva Instalación de Gas en Aulas para Servicio Penitenciario en DPOSS - Ushuaia	5.108.432	25,01 %	99,61 %
Nuevo Centro de Rehabilitación	32.073.014	S/I	S/I
Nuevo Hospital Regional de Ushuaia	106.227.161	48,84 %	50,20 %

Obra por Administración: Contratación Atmosférico - Tolhuin	2.220.000	S/I	S/I
Obra por Administración: Mantenimiento de Red Cloacal Margen Norte - Río Grande	2.040.000	S/I	S/I
Obra por Administración: Pintura de Puertas Interiores en Establecimientos Educativos Grupo A - Río Grande	889.840	S/I	S/I
Pintura Comisaría 4° Margen Sur - Río Grande	1.365.273	S/I	S/I
Pintura de Puertas Interiores en Establecimientos Educativos Grupo B - Río Grande	1.951.000	S/I	S/I
Pintura Exterior en el Ministerio de Obras Públicas - Río Grande	1.043.583	S/I	S/I
Pintura Exterior Escuela N° 10 - Río Grande	3.506.063	S/I	S/I
Pintura Exterior Escuela N° 7 - Río Grande	1.185.880	S/I	S/I
Plan de Restauración y Remediación Hidroambiental de la Laguna de los Cisnes	22.636.671	97,66 %	S/I
Reacondicionamiento de las Instalaciones del Ministerio de Salud - Río Grande	3.366.717	S/I	S/I
Reacondicionamiento y Mantenimiento de Oficinas de Políticas Socioeducativas y Coordinación - Ushuaia	569.839	S/I	S/I
Reacondicionamiento y Terminación Destacamento Policial en Cruce RN 3 y RP A	2.273.319	S/I	S/I
Reconocimiento de Gastos sobre Trabajos Ejecutados en Escuela N° 7 - Río Grande	545.891	S/I	S/I
Reconocimiento de Gastos sobre Trabajos Ejecutados en Establecimientos Educativos - Río Grande	2.097.235	S/I	S/I
Reconocimiento de Gastos sobre Trabajos Ejecutados en Establecimientos Educativos 2019 - Río Grande	486.842	S/I	S/I



"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"


Red de Gas Barrio Empleados de Comercio y Barrio Provincias Unidas - Tolhuin	10.500.363	S/I	S/I
Refacción de Instalación Sanitaria y Calefacción en Secretaria de Hidrocarburos y Energía - Río Grande	2.241.206	S/I	S/I
Refacción Oficinas del Ministerio de Educación Calle Alberdi - Río Grande	4.219.637	30,00 %	S/I
Refacción Red de Incendios Servicio Penitenciario - Río Grande	3.125.198	S/I	S/I
Refacción y Mantenimiento de la Comisaria 4º - Ushuaia	1.663.796	18,92 %	100,00 %
Refacción y Mantenimiento en el Gimnasio del Colegio José María Sobral - Ushuaia	2.876.046	50,32 %	44,50 %
Refacción y Mantenimiento Escuelas N° 20/26 Etapa II - Río Grande	4.405.424	S/I	S/I
Refacción y Mantenimiento Ex Hogar de Menores Aeroposta Argentina - Río Grande	1.154.446	S/I	S/I
Refacciones de Pisos en Colegio Provincial Antártida Argentina - Río Grande	4.215.232	S/I	S/I
Refacciones Interiores Varias en Casa de Gobierno - Ushuaia	24.915.352	89,95 %	95,23 %
Refacciones Varias Anexo Ministerio de Desarrollo Humano - Ushuaia	899.538	35,98 %	54,62 %
Refacciones Varias Canal 13 - Río Grande	2.903.221	S/I	S/I
Refacciones Varias en Policía de Investigación Calle Piedrabuena - Río Grande	2.019.493	S/I	S/I
Refacciones y Mantenimiento del Ministerio de Trabajo - Río Grande	1.848.836	52,71 %	100,00 %
Refacciones y Puesta en Funcionamiento HRU en el marco de Emergencia Edilicia - Ushuaia	26.532.112	20,55 %	100,00 %

Refuncionalización de Edificio para Áreas de Recursos Humanos, Protocolo, Trabajo y Empleo y Estadística - Ushuaia	1.937.702	S/I	S/I
Refuncionalización de Viviendas de Salud - Río Grande	2.130.567	S/I	S/I
Regularización Instalación de Gas Escuela Especial N° 1 Kayu Chenen - Ushuaia	2.069.397	S/I	S/I
Remodelación de Baños Casa de Gobierno Etapa II - Ushuaia	2.832.061	22,25 %	22,25 %
Reparación de Filtraciones de Techo y de Pisos de Salones de Danzas Centro Polivalente de Artes - Río Grande	2.142.495	S/I	S/I
Reparación de Instalación Eléctrica en Comisaria Primera Ushuaia	2.526.937	S/I	S/I
Reparación Instalación Sanitaria en Escuela N° 2 - Río Grande	4.181.505	S/I	S/I
Reparación Sala de Maquinas Escuela N° 20/26 - Río Grande	4.186.143	S/I	S/I
Reparación y Mantenimiento Gimnasio 640 Viviendas - Ushuaia	2.084.377	48,62 %	S/I
Reparación y Mantenimiento Gimnasio Ana Giro 243 Viviendas - Ushuaia	5.521.711	80,98 %	99,60 %
Reparaciones Varias en Centro de Formación Laboral Dr. Manuel Belgrano - Río Grande	762.106	S/I	S/I
Reparaciones y Refacciones en Oficinas de Calle Alem N° 160 para Funcionamiento de RUPE - Río Grande	2.547.916	S/I	S/I
Trabajos de Pintura en Cerco Perimetral Escuela N° 4 - Río Grande	1.302.901	S/I	S/I
Trabajos Varios en Centro Cultural Walter Buscemi - Río Grande	1.881.538	20,55 %	100,00 %
Trabajos Varios en Centro Infantil Integrado - Río Grande	4.151.926	S/I	S/I



"2022 - 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

Trabajos Varios en Defensa del Consumidor - Río Grande	1.053.598	S/I	S/I
Trabajos Varios en Dirección de Recursos Hídricos - Río Grande	3.182.851	S/I	S/I
Trabajos varios en Ministerio de Industria - Río Grande	4.683.381	S/I	S/I
Trabajos Varios en Ministerio de Obra Públicas - Río Grande	607.171	S/I	S/I
Trabajos Varios en Sala de Cisterna Exterior Escuela N° 14 - Río Grande	1.205.798	S/I	S/I


C.P. Esteban Sebastian TOVARES
Auditor Fiscal
Tribunal de Cuentas de la Provincia





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"2022 - Año del 40º Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas"

INFORME TECNICO N° 090 / 2022
LETRA: TCP-SC-GEOP-AT

USHUAIA, 25 de Abril de 2022

**Al AREA CONTABLE
del Grupo Especial de Obras Públicas**

Ref.: Informe de la Cuenta - Ejercicio 2021
Organismo:

PODER EJECUTIVO:

A. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

B. MINISTERIO de OBRAS y SERV. PÚBLICOS

Me dirijo a Uds. conforme lo solicitado anualmente por la Secretaría Contable en el tema de referencia, a los efectos de informar y emitir opinión acerca de las tramitaciones relacionadas con Obra Pública, llevadas a cabo por los organismos de la referencia, y que han tenido intervención de esta Área Técnica.


Arq. Rodolfo R. ROJAS
AUDITOR
Tribunal de Cuentas de la Provincia

121



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

“2022 – Año del 40º Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

A. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

1. Generalidades

Durante el año 2021, en esta Área Técnica se realizaron 10 (diez) intervenciones relacionadas a expedientes de Obra Pública tramitados por el **Ministerio de Educación**, correspondientes a 3 (tres) obras, en sus distintas etapas de licitación, ejecución o finalización.

En el **ANEXO 1** del presente Informe se detallan las mismas, siendo el resumen el siguiente:

- Por “Localidad”:

INTERVENCIONES POR LOCALIDAD	
ALMANZA	0
RIO GRANDE	1
TOLHUIN	0
USHUAIA	9



- Por “Tipo de Obra”:

INTERVENCIONES POR TIPO DE OBRA	
OBRA NUEVA	10
OBRA NUEVA E INFRAESTRUCTURA	0
AMPLIACION	0
AMPLIACION Y REMODELACION	0
REFACCION	0
REMODELACION	0
REFUNCIONALIZACION	0
OBRAS COMPLEMENTARIAS	0
INFRAESTRUCTURA	0
MANTENIMIENTO	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0
ADQUISICIÓN	0
LOCACIÓN	0
VARIAS	0



- Por “Estado de Obra”:

ESTADO DE OBRAS INTERVENIDAS	
SIN INICIO	1
SIN ESPECIFICAR	0
EN EJECUCION	0
TERMINADAS	2





Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

“2022 – Año del 40º Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

• Por “Instancia de Obra”:

INSTANCIA DE OBRA		(S)
CONTRATACION	5	92.958.606,42
CERTIFICADOS DE OBRA	5	17.584.565,53



NOTA: Se aclara que sólo se suman los montos de primeras intervenciones.

INSTANCIA DE OBRA	
CONTRATACION	2
CERTIFICADOS DE OBRA	6



2. Expedientes

a) Licitaciones:

El organismo se caracteriza por elaborar Proyectos y Pliegos Licitatorios que definen razonablemente el objeto de la contratación.

Durante el ejercicio 2021 disminuyó notablemente la licitación y contratación de obras respecto de 2020 y 2019.

b) Certificados de Obra:

No obstante a que los Certificados de Obra se controlan en el marco del Control Posterior, los incumplimientos o requerimientos que se formulan suelen ser subsanados.

La fecha de medición y certificación suele ser a fin de mes.

c) Planes de Trabajo y otra documentación:

En general se puede afirmar que las obras avanzan de acuerdo a los Planes de Trabajo aprobados, con desvíos en más o en menos que se encuentran dentro de la tolerancia admisible establecida en pliegos (10%).

d) Modificaciones de Contrato:

No se tramitaron durante el ejercicio analizado.

3. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes

a) Licitaciones:

Durante el ejercicio 2020 no se formularon Observaciones, Incumplimientos Sustanciales o Formales de importancia.

Los Requerimientos tienen que ver principalmente con la incorporación de documentación técnica digital que permita optimizar el control y seguimiento de los aspectos técnicos de las obras licitadas.

b) Certificados de Obra:

No se formularon Apartamientos Normativos durante el ejercicio 2021.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



"2022 – Año del 40º Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas"

c) Modificaciones de Contrato:

No se formularon Apartamientos Normativos durante el ejercicio 2021.

4. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra

En general se puede afirmar que las obras se han desarrollado de acuerdo a los Planes de Trabajo oportunamente aprobados.

Considerando las obras intervenidas se ha tomado conocimiento que las siguientes han sido concluidas durante el ejercicio analizado:

EXPTE.	OBRA/EDIFICIO	TIPO DE OBRA	LOCALIDAD
14285-ED-2019	Jardín a Crear en Malvinas Argentina – Plan 3000 Jardines	Obra Nueva	Ushuaia
14287-ED-2019	Jardín Barrió Río Pipó	Obra Nueva	Ushuaia

Considerando la información mensual suministrada por el organismo a partir del Plan de Auditoría 2021, el Área Contable GEOP (AOP) recibe la misma de manera consolidada, sobre la base de la cual pueden surgir otras obras finalizadas que no han sido intervenidas por parte de esta Área Técnica.

En cuanto a las Visitas a Obra realizadas, sólo se llegaron a inspeccionar 2 (dos) de las obras que se controlaron a través de expedientes. El detalle de las obras inspeccionadas es el siguiente:

FECHA	EXPTE.	EDIFICIO / SECTOR	LOCALID.	ESTADO DE OBRA
05/02/2021	14285-ED-2019	Jardín a Crear en Malvinas Argentinas-Ushuaia-TDF-Plan 3000 Jardines	USHUAIA	48,00%
05/02/2021	14287-ED-2019	Jardín a Crear en Urbanización Río Pipo-Ushuaia-TDF-Plan 3000 Jardines	USHUAIA	55,00 %
13/10/2021	14287-ED-2019	Jardín Urbanización Río Pipo	USHUAIA	100,00 %
13/10/2021	14285-ED-2019	Jardín Malvinas Argentina	USHUAIA	100,00%

NOTA: "ESTADO DE OBRA" al momento de la inspección.

La metodología implementada para las Visitas a Obra fue la misma que en ejercicios anteriores, es decir dando prioridad a la intervención de expedientes para no entorpecer los trámites administrativos y/o de pago; luego se organizaban las posibles inspecciones.

Durante las mismas, se determina en primera instancia si se están realizando tareas al momento de la inspección, el plantel de obreros presentes, sus condiciones de trabajo en cuanto a medidas de seguridad, los trabajos que se estaban realizando, el avance aproximado de cada uno de ellos respecto del total, el avance global estimado de la obra, etc.

También se toman fotografías del estado general y de los sectores intervenidos, labrando un Acta de Inspección de Obra Pública registrada e incorporada a los expedientes de pago de certificados de obra, al momento de tramitarse éstos.

No se dieron casos en los que se deba observar la calidad de los trabajos ejecutados.

Se contó con la colaboración de los Inspectores de Obra y del Área Técnica del organismo, que en la mayoría de los casos pudieron suscribir las Actas de Inspección labradas, ya que acompañaron a los Auditores Técnicos de este Tribunal de Cuentas, brindando la información solicitada por éstos.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"2022 – Año del 40º Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas"

5. Conclusión

El Ministerio de Educación dependiente del Poder Ejecutivo de la provincia es un organismo que, en líneas generales, ha seguido trabajando durante el ejercicio 2021 de manera ordenada, manteniendo la predisposición a modificar aquellos aspectos de las tramitaciones a los que se les ha formulado recomendaciones, requerimientos u observaciones por parte de esta Área Técnica.

En línea con lo indicado en el párrafo anterior, también manifestó predisposición a colaborar en las Visitas a Obra llevadas a cabo por esta Área Técnica.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

“2022 – Año del 40º Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

B. MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1. Generalidades

Durante el año 2021, en esta Área Técnica se realizaron 159 (ciento cincuenta y nueve) intervenciones relacionadas a expedientes de Obra Pública tramitados por el **Ministerio de Obras y Servicios Públicos**, correspondientes a 92 (noventa y dos) obras, en sus distintas etapas de licitación, ejecución o finalización.

En el **ANEXO 2** del presente Informe se detallan las mismas, siendo el resumen el siguiente:

- Por “Localidad”:

INTERVENCIONES POR LOCALIDAD	159
RÍO GRANDE	67
RURAL	4
TOLHUIN Y RÍO GRANDE	2
USHUAIA	89
TDF	8



- Por “Tipo de Obra”:

INTERVENCIONES POR TIPO DE OBRA	
OBRA NUEVA	31
AMPLIACION Y REMODELACION	6
REFACCION	34
REMODELACION	3
INFRAESTRUCTURA	30
MANTENIMIENTO	48
ADQUISICIÓN	5
VARIAS	1



- Por “Estado de Obra”:

ESTADO DE OBRAS INTERVENIDAS	
SIN INICIO	17
SIN ESPECIFICAR	21
EN EJECUCION	44
FINALIZADAS	10



- Por “Instancia de Obra”:

INSTANCIA DE OBRA	(S)
CONTRATACIÓN	\$ 1.737.075.677,92
CERTIFICADO DE OBRA	\$ 300.552.334,37
FONDOS PERMANENTES	\$ 3.460.101,98
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	\$ 532.912.973,28
REDET. DE PRECIOS	\$ 34.713.687,96
REDET. DE PRECIOS	\$ 34.713.687,96



NOTA: Se aclara que sólo se suman los montos de primeras intervenciones.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

“2022 – Año del 40º Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”

INSTANCIA DE OBRA	
CONTRATACION	93
CERTIFICADO DE OBRA	56
CONTRATACIÓN Y PAGO	1
FONDOS PERMANENTES	1
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	16
REDET. DE PRECIOS	1
VERIFICACIÓN DE OBRA	2



2. Expedientes

e) Licitaciones:

El organismo se caracteriza por elaborar Proyectos y Pliegos Licitatorios que definen razonablemente el objeto de la contratación.

f) Certificados de Obra:

Los Certificados de Obra son elaborados por la Contratista, a partir del Acta de Medición suscripta por el Representante Técnico y el Inspector de Obra. La fecha de medición y certificación suele ser a fin de mes.

g) Planes de Trabajo y otra documentación:

En general se puede afirmar que las obras avanzan de acuerdo a los Planes de Trabajo aprobados, con desvíos en más o en menos que se encuentran dentro de la tolerancia admisible establecida en pliegos (10%).

h) Modificaciones de Contrato:

Se tramitaron dentro de las condiciones establecidas en pliegos, no habiéndose registrado inconvenientes mayores.

En el caso de la obra del Hospital Regional Ushuaia (Etapa 1), tras una larga tramitación de la actual gestión de gobierno llevada a cabo para dilucidar el estado de obra ejecutada en las fundaciones (Auditoría Técnica Estructural contratada a un Estudio de Ingeniería privado), se aprobó el refuerzo, rediseño y recálculo de la Estructura, debido a los errores en el proyecto anterior y además por el cambio de normativa específica de las Estructuras de Hormigón Armado en el año 2018. Esas modificaciones se tradujeron en la adaptación y aprobación del Proyecto Ejecutivo (que había sido aprobado con observaciones en el año 2019), y a partir de ello dos Modificaciones de Contrato de significatividad respecto del presupuesto inicial.

La otra obra que se encontraba pendiente de terminación es la del Microestadio Cubierto en Río Grande, debido a que se tramitaba durante el ejercicio 2021 la aprobación de Obras Complementarias de proporción muy relevante que no llegaron a concluirse, por lo que serán analizadas en el próximo ejercicio.

3. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes

d) Licitaciones:

Durante el ejercicio 2021 se analizaron 4 (cuatro) Licitaciones en las que se adjudicaron ofertas que no eran las más convenientes, yendo el organismo en contra de los intereses del estado:

Expediente	Edificio / Tipo de Obra	Contratista	Monto de Obra
18566-MO-2020	Gimnasio Ana Giro Refacción y Mantenimiento	Corporación Costa Sur	\$ 3.956.922,29
8613-MO-2021 (RI y RII)	Escuela N° 41 y Jardín N°7 Mantenimiento y Reparación	Cañete Nelson MONTIEL	\$ 8.576.842,78
7952-MO-2021 (RI, II y III)	IPES Mantenimiento y reparación	FAB MAR Constucc. - Humberto L. CRUZ	\$ 2.143.471,29

Los requerimientos más habituales tienen que ver con el pedido de documentación licitatoria en formato digital para optimizar el control, tanto de la etapa licitatoria, como las posteriores correspondientes a certificados de obra, modificaciones contractuales, etc. El organismo suele cumplir los mismos.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



"2022 – Año del 40º Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas"

e) Certificados de Obra:

No obstante a que los Certificados de Obra se controlan en el marco del Control Posterior, los incumplimientos o requerimientos que se formulan suelen ser subsanados, no habiéndose registrado incumplimientos sustanciales y/o falta de contraprestación de los pagos realizados.

f) Modificaciones de Contrato:

No se formularon Apartamientos Normativos durante el ejercicio 2021.

4. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra

En general se puede afirmar que las obras se han desarrollado de acuerdo a los Planes de Trabajo oportunamente aprobados.

Considerando las obras intervenidas se ha tomado conocimiento que las siguientes han sido concluidas durante el ejercicio analizado:

EXPTE.	OBRA/EDIFICIO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA
1079-MO-2020	Colegio Técnico Olga B. de Arko	USHUAIA	REFACCION
1083-MO-2020	Escuela Provincial N° 1 D.F. Sarmiento	USHUAIA	REFACCION
1234-MO-2020	Escuela Provincial N° 47	USHUAIA	REFACCION
1239-MO-2020	Escuela Provincial N° 31 Juana Manso	USHUAIA	REFACCION
1890-MO-2020	I.P.E.S. Florentino Ameghino	USHUAIA	REFACCION
5915-MO-2017	Gimnasio Escuela de Policía	RIO GRANDE	NUEVA
10280-SO-2016	Asociación Civil Reencontrándonos	USHUAIA	OBRA NUEVA
13194-MO-2019	Subsecretaría de Defensa al Consumidor	USHUAIA	REFACCION
19854-MO-2021	Establecimiento Públicos y	USHUAIA	REFACCION

[Handwritten signature]

	Educativos		
62068-MO-2021	Escuela N°2	RIO GRANDE	REACONDIC.

Considerando la información mensual suministrada por el organismo a partir del Plan de Auditoría 2021, el Área Contable GEOP (AOP) recibe la misma de manera consolidada, sobre la base de la cual pueden surgir otras obras finalizadas que no han sido intervenidas por parte de esta Área Técnica.

Se realizaron 21 (veintiún) Visitas a Obra, correspondientes a las obras controladas, según el siguiente detalle:

EXPEDIENTE	EDIFICIO / SECTOR	LOCALIDAD	ESTADO DE OBRA	% AVANCE
5865-SD-2018	Laguna Hidro-Ambiental Laguna de los Cisnes	RIO GRANDE	SIN ACTIVIDAD	97,00 %
8790-MO-2017	Microestadio Cubierto	RIO GRANDE	EN EJECUCION	77,00 %
10280-MO-2016	Centro Preventivo Asistencial Asociación Civil Reencontrándonos	USHUAIA	TERMINADA	100,00 %
	HRU	USHUAIA	SIN TERMINAR	Sin Especificar
	HRU	USHUAIA	SIN TERMINAR	Sin Especificar
5336-MO-2019	Alimentacion de Gas Andorra B° Quinta 52-Cuesta del Valle.	USHUAIA	EN EJECUCION	52,00%
18566-MO-2020	Gimnasio Ana Giró	USHUAIA	TERMINADA	100,00%
8758-MO-2021	Colegio Polivalente de Arte	USHUAIA	PARALIZADA	Sin Especificar
8790-MO-2017	Microestadio Cubierto	RIO GRANDE	EN EJECUCION	80,00%
5915-MO-2017	Gimnasio Colegio de Policia	RIO GRANDE	EJECUTADA	100,00%
25224-MO-2020	HRRG	RIO GRANDE	EN EJECUCION	25,00%
19357-MO-2018	Escuela N° 21 - SUM	RIO GRANDE	EN EJECUCION	55,00%
19355-MO-2018	Colegio Alicia Moreau de Justo	RIO GRANDE	EN EJECUCION	50,00%
17594-MO-2018	Escuela N° 20	RIO GRANDE	EN EJECUCION	65,00%



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"2022 – Año del 40º Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas"

33979-MO-2020	Casa de Gobierno	USHUAIA	EN EJECUCION	45,00%
52244-MO-2020	Casa de Gobierno	USHUAIA	EN EJECUCION	90,00%
6750-MO-2019	Escuela N° 20/26	RIO GRANDE	TERMINADA	100,00%
17596-MO-2018	Escuela Tecnica M/S	RIO GRANDE	EN EJECUCION	52,00%
235-MO-2020	Colegio Polivalente de Arte/ Jardin N° 5	RIO GRANDE	SIN ACTIVIDAD	88,13%
10644-MO-2021	Usuarios de Tolhuin y Rio Grande	RIO GRANDE	SIN ACTIVIDAD	15,00%
24842-MO-2020	Hospital Regional Rio Grande	RIO GRANDE	TERMINADA	100,00%

La metodología implementada para las Visitas a Obra fue la misma que en ejercicios anteriores, es decir dando prioridad a la intervención de expedientes para no entorpecer los trámites administrativos y/o de pago; luego se organizaban las posibles inspecciones.

Durante las mismas, se determina en primera instancia si se están realizando tareas al momento de la inspección, el plantel de obreros presentes, sus condiciones de trabajo en cuanto a medidas de seguridad, los trabajos que se estaban realizando, el avance aproximado de cada uno de ellos respecto del total, el avance global estimado de la obra, etc.

También se toman fotografías del estado general y de los sectores intervenidos, labrando un Acta de Visita de Obra Pública registrada e incorporada a los expedientes de pago de certificados de obra, al momento de tramitarse éstos.

No se dieron casos en los que se deba observar la calidad de los trabajos ejecutados.

Se contó con la colaboración de los Inspectores de Obra y del Área Técnica del organismo, que en la mayoría de los casos pudieron suscribir las Actas de Inspección labradas, ya que acompañaron a los Auditores Técnicos de este Tribunal de Cuentas, brindando la información solicitada por éstos.

5. Conclusión

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos dependiente del Poder Ejecutivo de la provincia es un organismo que, en líneas generales, ha seguido trabajando durante el ejercicio 2021 de manera ordenada, manteniendo la predisposición a modificar aquellos aspectos de las tramitaciones a los que se les ha formulado recomendaciones, requerimientos u observaciones por parte de esta Área Técnica.

En línea con lo indicado en el párrafo anterior, también manifestó predisposición a colaborar en las Visitas a Obra llevadas a cabo por esta Área Técnica.

R.R.



A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "COMANDO EN JEFE" at the top, "ÁREA TÉCNICA" in the middle, and "TRIBUNAL DE CUENTAS" at the bottom. The signature is written in a cursive style.

ANEXO 1
Informe Técnico N° 090/22

OBRAS INTERVENIDAS

EXPT E MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR	% AVANCE
14285-ED-2019	M.Ed.	Jardin a Crear en Malvinas Argentina - Plan 3000 Jardines	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construccion de Jardin de Infantes Prototipo de 3 Salas..	INVERSUR SRL	100,00 %
14287-ED-2019	M.Ed.	Jardin Barrio Rio Pipo	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construccion Jardin prototipo	INVERSUR SRL	100,00 %
31600-ED-2021	M.Ed.	Jardin de Infante N° 05 Tol Oleje	RIO GRANDE	OBRA NUEVA	Construccion Anexo	J.P.SERYAL CONSTRUCCIONES S.A.	Sin Inicio

ANEXO 2
Informe Técnico N° 090/22

OBRAS INTERVENIDAS

EXPT. MADRE	ORG. GENERADOR	ORG. / EDIFICIO / SECTOR INTERVENIDO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PROVEEDOR	% AVANCE
235-MO-2020	MOySP	Colegio Polivalente de Arte y Jardín de Infante N° 5	RIO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Correctivo	PAULETTI MIGUEL A. SERVICIO Y CONSTRUCCION	86,13 %
844-MS-2017	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	OBRA NUEVA	Ampliación del Edificio - Etapa 1	DAL CONSTRUCCIONES S.A.	46,97 %
1079-MO-2020	MOySP	Colegio Tecnico Olga B. de Arko	USHUAIA	REFACCION	Ejecutar y recibir los trabajos de refaccion del edificio	JONATAN PEREZ	100,00 %
1063-MO-2020	MOySP	Escuela Provincial N° 1 D.F. Sarriento	USHUAIA	REFACCION	Refaccion del Edificio	PROYECTO INMOBILIARIO SRL	100,00 %
1234-MO-2020	MOySP	Escuela prov N° 47	USHUAIA	REFACCION	Refaccion del Edificio	FANTONI S.A.S.	100,00 %
1239-MO-2020	MOySP	Escuela Provincial N° 31 Juana Manso	USHUAIA	REFACCION	Refaccion del Edificio	J&K CONSTRUCTORA	100,00 %
1342-MO-2016	MOySP	Escuela Prov N° 32	RIO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Correctivo	BORDON SRL	86,00 %
1695-MO-2015 (RII)	MOySP	Gasoducto Fuegoquino	TDF	INFRAESTRUCTURA	Ampliacion de la Capacidad de Transporte de gas del Sistema Fuegoquino (2015) - Renglon 2	CONINSA S.A.	92,96 %
1695-MO-2015 (RII)	MOySP	Gasoducto Fuegoquino	TDF	INFRAESTRUCTURA	Ampliacion de la Capacidad de Transporte de gas del Sistema Fuegoquino (2015) - Renglon 3	CONINSA S.A.	
1894-MO-2020	MOySP	Escuela Provincial N° 13	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparacion	CONSTRUCTORA ATLANTICO SUR	Sin Especificar
1887-MO-2020	MOySP	Escuela Provincial N° 15	USHUAIA	REFACCION	Ejecutar y recibir los trabajos de refaccion del edificio	TNT SRL	98,27 %
1890-MO-2020	MOySP	I.P.E.S. Florentino Ameghino	USHUAIA	REFACCION	Refaccion del Edificio	CORPORACIONES COSTA SUR S.A.	100,00 %
3366-MO-2020	MOySP	Escuela N° 32	RIO GRANDE	REFACCION	Mantenimiento Correctivo	BORDON SRL	Sin Inicio
3444-MO-2020	MOySP	Escuela N° 30 "OSHOVIA"	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y reparacion	CONSTRUCTORA ATLANTICO SUR	
5184-MO-2021	MOySP	Escuela N° 13 "Almirante Brown"	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y reparacion	CORPORACION COSTA DEL SUR	
5865-MO-2018	MOySP	Laguna de los Cisnes	RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Restauracion y Remediacion Hidro-Ambiental	NAKON SUR S.A.	14,11 %
5915-MO-2017	MOySP	Gimnasio Escuela de Policia	RIO GRANDE	NUEVA	Ampliación de Oficinas	COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES S.A.	100,00 %
7070-MO-2021	MOySP	Escuela N° 9; 24 y 30	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparación	JONATAN PEREZ	Sin Inicio

ANEXO 2
Informe Técnico N° 090/22

OBRAS INTERVENIDAS

	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	VARIAS	Trabajos de Urgencia	GRUPO ALEM S.R.L.	
7784-MO-2020	MOySP	IPES	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y reparación	EAB MAR Construcc - Humberto L. CRUZ	Sin especificar
7952-MO-2021 (RII)	MOySP	Colegio Kloketen	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y reparación	EAB MAR Construcc - Humberto L. CRUZ	Sin especificar
7952-MO-2021 (RIII)	MOySP	Jardin N° 19	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y reparación	FAB MAR Construcc - Humberto L. CRUZ	Sin especificar
8106-MO-2021	MOySP	Escuela Especial N° 1	USHUAIA	REFACCION	Refacción y Mantenimiento	JONATAN PEREZ	Sin Inicio
8443-MO-2019	MOySP	Red de Gas Urbanización San Martín	RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Ampliación de red de Gas Natural	GADA S.A.	83,86 %
8454-MO-2021	MOySP	Gimnasio Deportivo Urbanización Rio Pipo Ush	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción del gimnasio	CONDOR S.A.	Sin Inicio
8613-MO-2021 (RI y RI)	MOySP	Escuela N° 41 y Jardin N°7	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparación	Cañete Nelson MONTIEL	Sin especificar
8758-MO-2021	MOySP	Colegio Polivalente de Arte	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparación	DANIEL AGUILAR- PATAGONIA OBRAS	Sin especificar
8790-MO-2017	MOySP	Microestadio Cubierto	RIO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción de un Microestadio, una Playa de Estacionamiento y una Cancha Auxiliar	CFOSA	73,09 %
8889-MO-2021 (RI)	MOySP	Escuela N° 16 Dr. Arturo Mateos	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparación	Serv de Construcc y Mantenim de Mirta RUIZ	
8889-MO-2021 (RII)	MOySP	Escuela N° 40 Maria Elena Walsh	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparación	Serv de Construcc y Mantenim de Mirta RUIZ	
8889-MO-2021 (RIII)	MOySP	Jardin N° 20 Lucrecio de Fuego	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparación	Serv de Construcc y Maatenim de Mirta RUIZ	
9055-MO-2018	MOySP	Gimnasio Luis Carlibaldi	RIO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción del Gimnasio	ANGEL MASCIOTRA S.A.- CORP. Costa Sur S.A.-UT	
9371-MO-2021 (RI)	MOySP	Colegio Prox Ernesto Sabato	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparación	TNT SRL	
9371-MO-2021 (RII)	MOySP	Colegio Provincial Los Andes	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparación	TNT SRL	
9401-MO-2021	MOySP	Gimnasio Deportivo Esc. 31	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Reparación	MIRTA RUIS-MR	
9669-MO-2017	MOySP	B° Andorra	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Construcción e Instalación de la Red de Distribución de Gas Parte II	Ing. Hector CZELADA	95,62 %
10273-MO-2021	MOySP	Escuela Provincial N° 7	RIO GRANDE	REFACCION	Pintura y refacción del edificio	Coop. De Trabajo Union por la Margen Sur Ltda	

ANEXO 2
Informe Técnico N° 090/22

OBRAS INTERVENIDAS

10280-SO-2016	MOySP	Asociación Civil Reencuentrandonos	USHUAIA	OBRA NUEVA	Alimentación de Red de Distribución de Gas Natural - Parte II	ROBINSON VARGAS	100,00 %
10466-MO-2018	MOySP	Gasoducto San Martín y Gasoducto Fueguino	TDF	INFRAESTRUCTURA	Interconexión entre los dos gasoductos	CONINSA SA	Ant. Fin.
10644-MO-2021	MOySP	Usuarios de Tolhuin y Río Grande	TOIHUIN RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Comexión masiva de gas Domkiliaria	CONSTRUCTORA PATAGONIA SRL	
12688-MO-2021	MOySP	Escuela Valientes de Malvinas	RIO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación de dos Aulas	ALDO DANIEL CANO	Sin Especificar
13119-MO-2016	MOySP	Barrio Arraigo Sur	RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Infraestructura publica, privada y Nexos de Aguas y Cloacas.	PROALSA SRL	Sin Especificar
13194-MO-2019	MOySP	Subsecretaria de Defensa al Consumidor	USHUAIA	REFACCION	Refaccion de las Oficinas	Alberto Javier GRENZ	Finalizadas
14564-MO-2017	MOySP	Ruta N° 30	RURAL	INFRAESTRUCTURA	Apertura de Traza - Tramo II	Juan Felipe GANCEDO S.A.	18,40 %
14565-MO-2017	MOySP	Ruta N° 30	RURAL	INFRAESTRUCTURA	Apertura de Traza - Tramo III	Juan Felipe GANCEDO S.A.	6,61 %
15239-MO-2021 (RI)	MOySP	Edificios Públicos	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Exterior	Coop. Trabajadores Unidos TDF Ltda.	Sin Inicio
15239-MO-2021 (RII)	MOySP	Edificios Públicos	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Exterior	Coop. De Trabajo Casa Base Limitada	Sin Inicio
16077-MO-2017	MOySP	Red de Gas Barrio Arraigo Sur-MS-RG	RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Construcción de Red de Gas Barrio Arraigo Sur-MS-RG	COCCARO HNOS S.A.	88,95 %
16551-MO-2017	MOySP	Complejo Deportivo Margen Sur	RIO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción Nuevo Complejo Deportivo	PROYECTOS FUEGUINOS SRL	
17148-MO-2018	MOySP	Colegio Prov Comandante Luis Piedrabuena	RIO GRANDE	AMPLIACION Y REMODELACION	Ampliación y refaccion del edificio	SICA RIO GRANDE SRL	41,58 %
17594-MO-2018	MOySP	Escuela Prov N° 20-Angela Lolj	RIO GRANDE	AMPLIACION	Ampliación del Edificio	CORPORACION COSTA DEL SUR	
17596-MO-2018	MOySP	Escuela Tecnica M/S	RIO GRANDE	OBRA NUEVA	Construcción de la Escuela	COCCARO HNOS	20,91 %
18565-MO-2020	MOySP	Gimnasio 640 viv	USHUAIA	MANTENIMIENTO	Reparacion y Mantenimiento	MIRTA RUIS-MR	Sin Especificar
18566-MO-2020	MOySP	Gimnasio Ana Giro	USHUAIA	REFACCION	Refaccion y Mantenimiento del Gimnasio	CORPORACION COSTA DEL SUR	Sin Especificar
19355-MO-2018	MOySP	Colegio Alicia Morreau de Justo	RIO GRANDE	AMPLIACION	Ampliación del Edificio	CORPORACION COSTA DEL SUR	17,80 %

ANEXO 2
Informe Técnico N° 090/22

OBRAS INTERVENIDAS

19337-MO-2018	MOySP	Escuela Provincial N° 21-SUM	RIO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del Edificio	CORPORACIÓN COSTA DEL SUR	39,68 %
19360-MO-2018	MOySP	Jardín N° 27	RIO GRANDE	AMPLIACIÓN	Ampliación del Edificio	POLIGONO SUR S.R.L.	96,14 %
19752-MO-2017	MOySP	Barrio 22 de Julio MS	RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Construcción Red de Gas	COCCARO HNOS	34,25 %
19754-MO-2017	MOySP	B° Provincias Unidas MS	RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Construcción Red de Gas	COCCARO HNOS	
19755-MO-2017	MOySP	Barrio 11 de Noviembre MS	RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Construcción Red de Gas	Ing. Hector CZELADA	
19854-MO-2021	MOySP	Establecimiento Públicos y Educativos	USHUAIA	REFACCION	Refaccion en Edificios	ALEM S.R.L.	100,00 %
20580-EC-2016	MOySP	Red de Fibra Óptica	TDF	OBRA NUEVA	Obra civil desarrollo troncal F.O.	TV Fuego S.A. - COIVALSA S.A. - UT	99,58%
20582-EC-2016	MOySP	Red de Fibra Óptica	TDF	INFRAESTRUCTURA	Adquisición e Instalación de la electrónica	TV Fuego S.A. - COIVALSA S.A. - UTE	Sin Inicio
20617-MO-2020 (R 1 y 2)	MOySP	Establecimiento Educativo - Grupo B	TDF	ADQUISICIÓN	Pinura de puertas de interiores	VILTE Ramón César	Sin Especificar
20617-MO-2020 (R 3 al 9)	MOySP	Establecimiento Educativo - Grupo B	TDF	ADQUISICIÓN	Pinura de puertas de interiores	CONTINENTAL MADERAS	Sin Especificar
22166-MO-2020	MOySP	Hospital Regional Ushuaia	USHUAIA	AMPLIACION Y REMODELACION	Refuncionalización y ampliación.	JAYTER ALBERTO GRENZ	
24842-MO-2020	MOySP	Hospital Regional Río Grande	RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Puesta en marcha de un grupo generador de energía	COOP. ELECTRICA RG	
25050-MO-2021	MOySP	Colegio Provincial Antártida Argentina	RIO GRANDE	ADQUISICIÓN	Adquisición de Caldera	TOBAREZ SANCHEZ S.A.	
25224-MO-2020	MOySP	Hospital Regional Río Grande	RIO GRANDE	REMODELACION	Ejecución, renovación, completamiento y adecuación de las instalaciones completas en la nueva guardia del Hospital.	PROALSA SRL.	Sin Inicio
26477-MO-2020	MOySP	Edificios Educativos Grupo 12	RIO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	Fernando Emanuel BARRIOS	Sin Inicio
26504-MO-2020	MOySP	Edificios Educativos varios	RIO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	Walter Raúl VILLAFANE	Sin Especificar
26506-MO-2020	MOySP	Edificios Educativos varios	RIO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	Fernando Emanuel BARRIOS	Sin Especificar
26510-MO-2020	MOySP	Edificios Educativos varios	RIO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	David Claudio SPIENDIANI	Sin Especificar
26512-MO-2020	MOySP	Edificios Educativos varios	RIO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	Fernando Emanuel BARRIOS	Sin Especificar
26514-MO-2020	MOySP	Edificios Educativos Grupo 9	RIO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento Preventivo	Fernando Emanuel BARRIOS	



ANEXO 2
Informe Técnico N° 090/22

OBRAS INTERVENIDAS

27659-MO-2021	MOySP	Centro Polivalente de Arte-Prof. Ines Maria Bustelo	USHUAIA	AMPLIACIÓN	Ampliación del Edificio	ROBINSON VARGAS	Sin Especificar
28431-MO-2020	MOySP	Comisaria B° San Vicente de Paul	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	AMBIENTE SUR INGENIERIA SRL	Sin Especificar
33815-MO-2020	MOySP	Edificio II de la División Intituros Policiales	RIO GRANDE	REFACCION	Refaccion del Edificio II	RYAN CONSTRUCCIONES SRL	Sin Inicio
31741-MO-2020	MOySP	Aulas Servicio Penitenciario Predio DPOSS-Ush	USHUAIA	REFACCION	Nueva instalacion de gas Aulas del Penitenciario	DAZ JOSE MAURICIO	Iniciada
33973-MO-2020	MOySP	Casa de Gobierno	USHUAIA	REFACCION	Refacciones internas en el Edif, ejec/rop de rampas y Ascensores	AMBIENTE SUR INGENIERIA SRL	Sin Especificar
36702-MO-2021	MOySP	Establecimientos Educativos de Ush	USHUAIA	ADQUISICIÓN	Adquisición de equipos y elementos de Calefaccion	OMAR DANIEL BONFIGLI	Sin Especificar
43482-MO-2020	MOySP	Centro Modular Sanitario para lugares turisticos	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción de platea de fundación y obras complementarias	AMBIENTE SUR INGENIERIA SRL	
46864-MO-2020	MOySP	Estacionamiento Av. San Martin y Av. Prefectura Naval	RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Construcción del Estacionamiento	CALIPPA CONSTRUCCIONES S.A.	Sin Inicio
48623-MO-2021	MOySP	Radio Fundacion Austral	USHUAIA	REFACCION	Refaccion del Ed	METALUSH SUR S.R.L.	Sin Inicio
50126-MO-2021	MOySP	Escuela N° 47 y Colegio T.P. Antonio Marte	USHUAIA	AMPLIACIÓN	Ampliación del edificio.	CORPORACIÓN COSTA DEL SUR	Sin Especificar
52475-MO-2020	MOySP	Centro de Rehabilitación en la Ciudad de Ush	USHUAIA	OBRA NUEVA	Construcción del Edificio	UT CONDOR SA-GADA SA	Sin Inicio
52244-MO-2020	MOySP	Casa de Gobierno	USHUAIA	REFACCION	Refacciones internas en el Edif.	AMBIENTE SUR INGENIERIA SRL	Sin Inicio
53743-MO-2021	MOySP	Edificios Publicos	RIO GRANDE	MANTENIMIENTO	Mantenimiento y Conservacion Clocal	LEVANTAR SRL	Sin Especificar
54101-MO-2020	MOySP	Gimnasio Colegio Provincial dr. Jose Maria Sobral.	USHUAIA	REFACCION	Refaccion y Mantenimiento del Gimnasio	MONTIEL CAÑETE NELSON	Sin Inicio
61567-MO-2021	MOySP	Laguna de los Cisnes	RIO GRANDE	INFRAESTRUCTURA	Obras Complementarias	NAKON SUR S.A.	Sin Inicio
62162-MO-2021	MOySP	Ruta N° 3	USHUAIA	INFRAESTRUCTURA	Tramo Emplame av Alen PNTDF	AMBIENTE SUR INGENIERIA SRL	Sin Inicio
63068-MO-2021	MOySP	Escuela N°2	RIO GRANDE	REACONDICIONAMIENT O	Reparacion de Instalacion Sanitaria	El mercado de Raul Walter VII JAFANF	Finalizadas

